社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和06年01月04日

計画の名称	山梨市駅南口周辺の通学路整備（防災・安全）												
計画の期間	令和０６年度　～　令和１０年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	山梨市												
計画の目標	山梨市駅周辺地区の交通結節点の改築を行い、円滑な交通を確保し、安全で安心な通学路を整備するとともに、豊かな公共空間を備えた良好な市街地形成を図り、人が行き交う賑わいのある地域づくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	957	A	957	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R6末）	（R8末）	（R10末）
1	通学路における通学路交通安全点検プログラムに基づいた合同点検を受け、危険と位置付けられた箇所に対策を実施し交通環境の改善を図る。（R6 0% → R10 100%）			
	駅南地域内の通学路について合同点検危険個所の危険個所数の解消率を指標とする。 （駅南地域整備後の危険個所解消率）＝(整備により解消済の危険個所数）／（整備前の危険個所数）×100（%）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

案件番号：　0000539808

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R06	R07	R08	R09	R10	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	山梨市	直接	山梨市	S街路	改築	(都)加納岩小学校西通り線(南口広場含む)	延長L＝230m、幅員W＝13m、広場面積約3,000㎡	山梨市	■	■				23		－
	A01-002	街路	一般	山梨市	直接	山梨市	S街路	改築	(都)加納岩小学校西通り線第Ⅱ期	延長L＝397m、幅員W＝13m	山梨市	■	■	■			702		－
	A01-003	街路	一般	山梨市	直接	山梨市	S街路	改築	(都)加納岩小学校前通り線	延長L＝170m、幅員W＝13m	山梨市	■	■	■			232		－
											小計						957		
											合計						957		

案件番号： 0000539808


交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R06	R07			
配分額（a)	237	206			
計画別流用増△減額（b)	0	△45			
交付額（c=a+b)	237	161			
前年度からの繰越額（d)	33	159			
支払済額（e)	111	184			
翌年度繰越額（f)	159	136			
うち未契約繰越額(g)	131	101			
不用額（h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	48.51	31.56			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	埋蔵文化財調査に伴う事業計画の見直しに期間を要したため	他事業との調整等に時間を要したため			

参考図面　社会資本総合整備計画(道路事業(街路))

計画の名称	山梨市駅南口周辺整備の通学路整備(防災・安全)		
計画の期間	令和6年度　～　令和10年度(5年間)	交付対象	山梨市

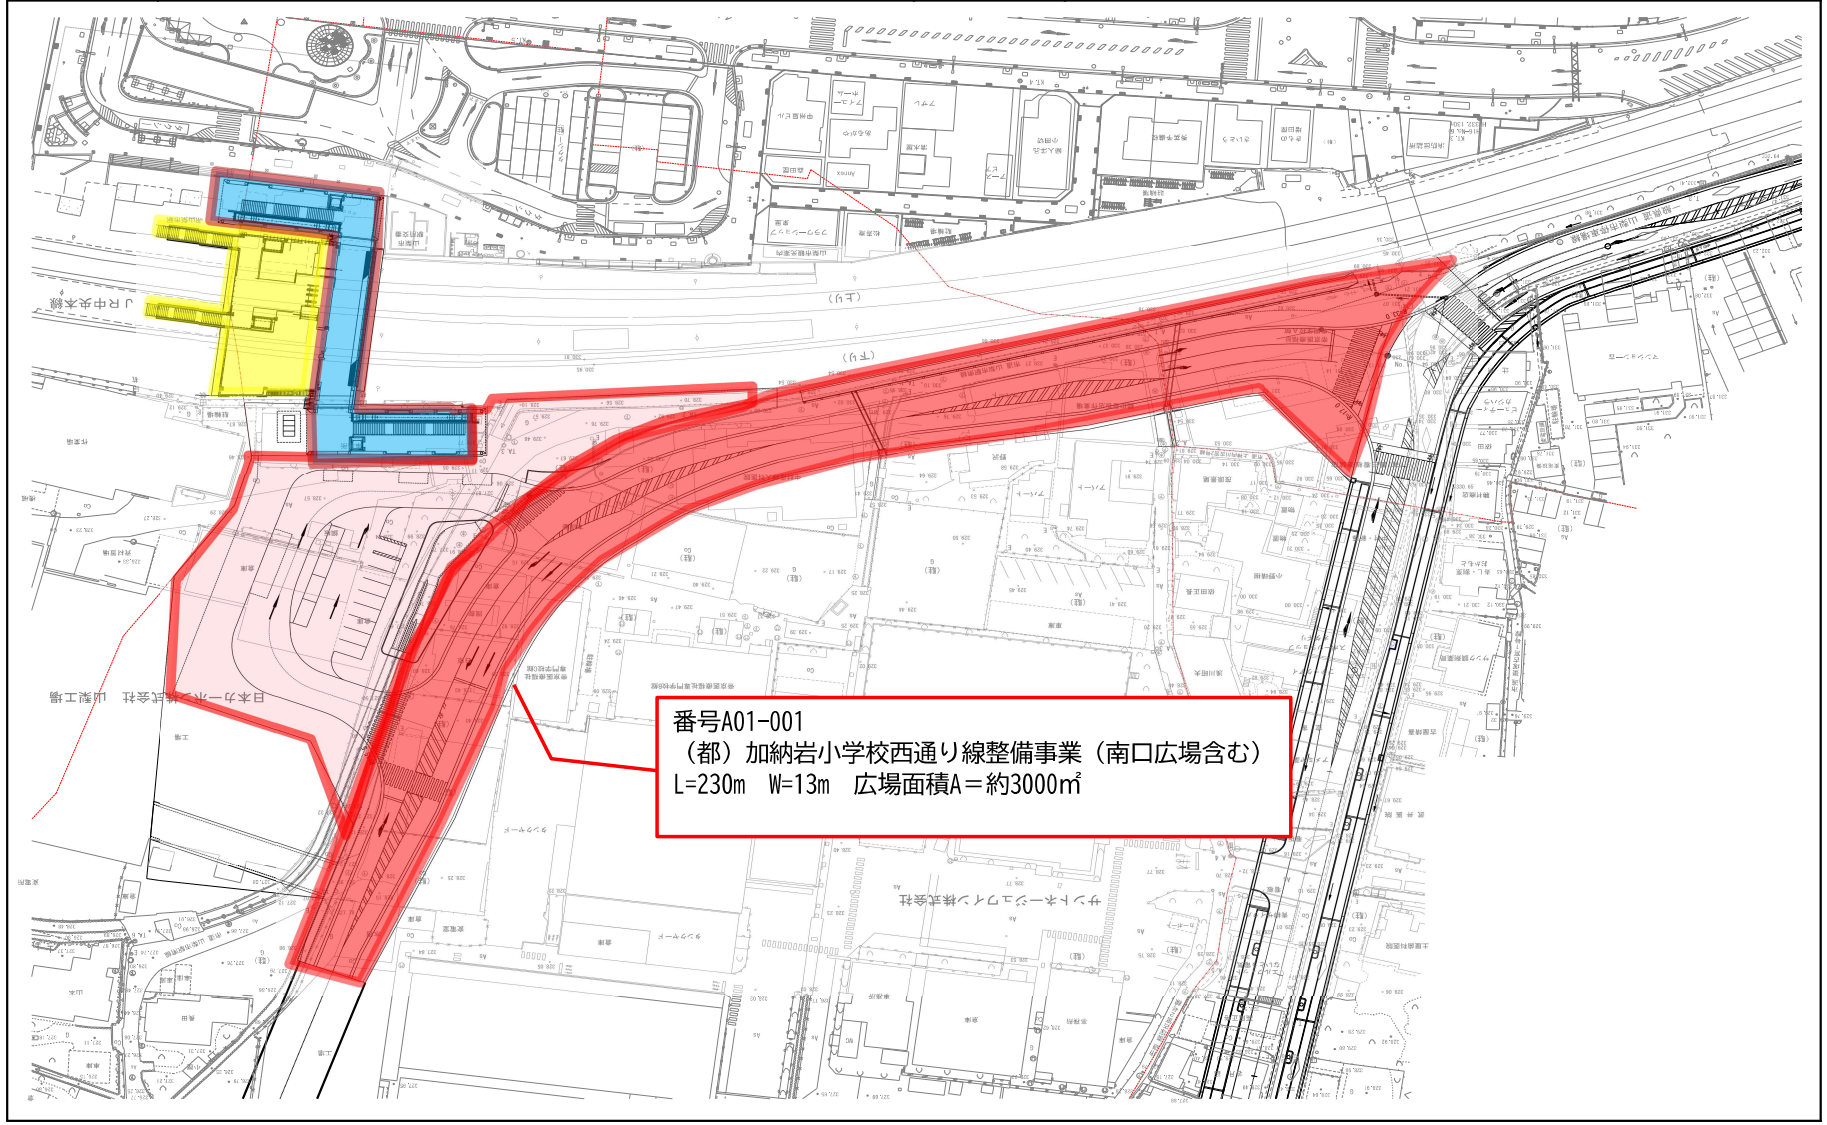

参考図面　社会資本総合整備計画(道路事業(街路))

計画の名称	山梨市駅南口周辺の通学路整備(防災・安全)		
計画の期間	令和6年度　～　令和10年度(5年間)	交付対象	山梨市

番号A01-002
（都）加納岩小学校西通り線整備事業（第Ⅱ期）
L= 397m　　W= 13m

番号A01-003
（都）加納岩小学校前通り線整備事業
L= 170m　　W= 13m

